# みやのうえ保育園整備事業について

## 1. 新園舎建設にあたっての課題

令和６年９月に開催されました公の施設等整備調査特別委員会におきまして、プレゼンテーション時の提案内容についてご説明いたしましたが、園庭に仮園舎を建設し、先行して遊戯室の建設を進めることは、狭い敷地内を毎日工事車両が出入りする危険性など園児の安全面や保健福祉事務所から給食提供の際の衛生面の確保について指摘を受けるなど課題が露呈し、園庭に仮園舎を建設するのは困難と結論付けを行い、新園舎建設中の保育場所の確保が必要となりました。

## 2. 新園舎建設期間中のみやのうえ保育園児の保育場所について

（１）検討案

| No. | 建替え工事中の保育場所 | メリット | 課題 |
|---|---|---|---|
| 1 | 湯河原小学校内に間借り | ・保育園に通う保護者の負担はあまり変わらない | ・給食の提供が困難<br>・トイレ等の改修費用 |
| 2 | 湯河原小学校グラウンドに仮園舎を建設 | ・保育園に通う保護者の負担はあまり変わらない | ・建設及び解体費用は約２億円<br>・グラウンドの使用制限（運動会の開催が困難等） |
| 3 | 他の園に転園 | ・費用を抑えられる | ・保護者の理解<br>・保護者に送迎の負担が生じる |

（２）今後の方向性

各検討案について、神奈川県に確認を取り、湯河原小学校とも協議を重ねた結果、費用負担も少なく、保育園という環境で生活できるNo.３の「他の園に転園」で、今後保育園の保護者に説明会を開催し、理解を得たいと考えます。

（３）転園時期及び転園先について

①転園時期…令和８年４月（予定）
②転園先…「おにわ保育園」または「まさご保育園」

≪参考≫令和８年度新入園児募集見込（令和６年12月現在）

| 保育園名 | | ５歳児 | ４歳児 | ３歳児 | ２歳児 | １歳児 | ０歳児 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| おにわ保育園 | R8.4在園見込 | 25 | 26 | 18 | 16 | 3 | 0 | 88 |
| | **募集予定** | **0** | **0** | **4** | **2** | **5** | **3** | **14** |
| | 園児計 | 25 | 26 | 22 | 18 | 8 | 3 | 102 |
| まさご保育園 | R8.4在園見込 | 15 | 22 | 12 | 16 | 3 | 0 | 68 |
| | **募集予定** | **10** | **3** | **3** | **2** | **15** | **6** | **39** |
| | 園児計 | 25 | 25 | 15 | 18 | 18 | 6 | 107 |
| たちばな保育園 | R8.4在園見込 | 14 | 15 | 11 | 10 | 3 | 0 | 53 |
| | **募集予定** | **11** | **10** | **4** | **8** | **5** | **3** | **41** |
| | 園児計 | 25 | 25 | 15 | 18 | 8 | 3 | 94 |
| 合　計 | R8.4在園見込 | 54 | 63 | 41 | 42 | 9 | 0 | 209 |
| | **募集予定** | **21** | **13** | **11** | **12** | **25** | **12** | **94** |
| | 園児計 | 75 | 76 | 52 | 54 | 34 | 12 | 303 |
| **令和７年度新入園児見込** | | **3** | **1** | **15** | **12** | **36** | **6** | **73** |
| **令和６年度新入園児実績** | | **1** | **3** | **10** | **17** | **21** | **7** | **59** |

※みやのうえ保育園は令和８年度～令和９年度募集停止
※おにわ保育園のR8.4在園見込みに、みやのうえ保育園児を含む
※赤字部分は認可定員超過（保育の弾力化）

## 3. スケジュール案の見直しについて（赤字は変更案）

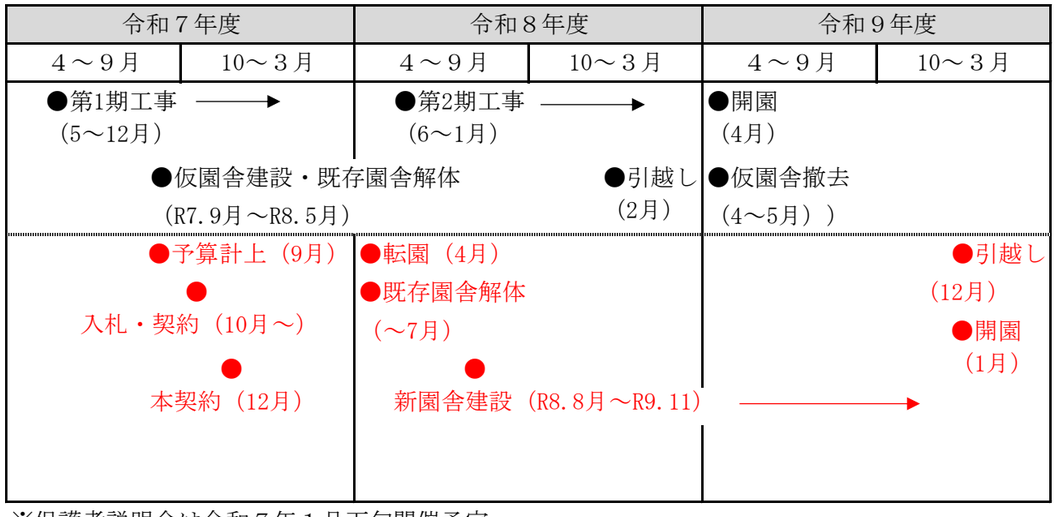


※保護者説明会は令和７年１月下旬開催予定

# 参考資料
